



Graficas Burndown

Sprint 1: Inicio y Estructura Base

Desglose de Historias de Usuario y Tareas Sprint 1				
ID	Historia de Usuario / Tarea	Prioridad	Subtareas / Puntos	Estado Final
#101	HU-01: Registro de Usuarios	Alta	3/3/2026	Terminado (100%)
#102	HU-02: Inicio de Sesión	Alta	3/3/2026	Terminado (100%)
#103	HU-03: Arquitectura y BD Inicial	Crítica	2/2/2026	Terminado (100%)
#104	HU-04: Entorno de Desarrollo y Repositorio	Alta	2/2/2026	Terminado (100%)
#105	Diseño de la estructura de la BD base	Crítica	1/1/2026	Terminado
#106	Configuración del servidor y entorno local	Crítica	1/1/2026	Terminado



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com




123-456-7890



Graficas Burndown

Tabla de Datos Burndown			
Día / Fecha	Trabajo Ideal Restante	Trabajo Real Restante	Eventos / Hitos Clave
Día 1 (18 May)	12	12	Inicio del Proyecto y Sprint 1. Asignación de roles.
Día 3 (21 May)	9.6	10	Configuración del repositorio y servidor (#106).
Día 5 (23 May)	7.2	7	Diseño de base de datos base e integración (#103, #105).
Día 8 (26 May)	4.8	5	Desarrollo del módulo de registro de usuarios (#101).
Día 11 (29 May)	2.4	2	Finalización de inicio de sesión (#102) y pruebas base.
Día 14 (31 May)	0	0	Cierre exitoso del Sprint 1. Entorno y Auth completos.

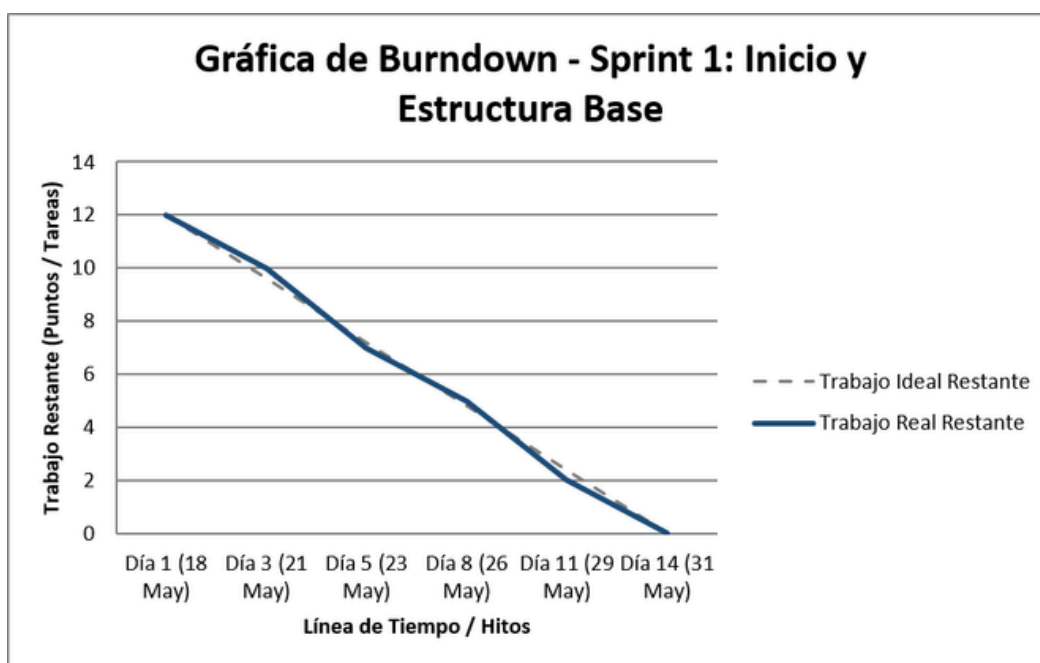

<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



Graficas Burndown

Sprint 2: Gestión de Usuarios

Desglose de Historias de Usuario y Tareas				
ID	Historia de Usuario / Tarea	Prioridad	Subtareas / Puntos	Estado Final
#132	HU-05: Gestión de mi Cuenta	Alta	3/3/2026	Terminado (100%)
#133	HU-06: Gestión del Catálogo de Productos	Media	3/3/2026	Terminado (100%)
#134	HU-07: Gestión de Usuarios y Roles	Alta	3/3/2026	Terminado (100%)
#137	Implementar usuario con accesos y perfil editable	Alta	1/1/2026	Terminado
#142	Desarrollo frontend y backend de Gestión de Usuarios	Crítica	1/1/2026	Terminado
#143	Diseño de interfaz y QA - Gestión de Usuarios	Crítica	1/1/2026	Terminado



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com




123-456-7890



Gráficas Burndown

Tabla de Datos Burndown			
Día / Fecha	Trabajo Ideal Restante	Trabajo Real Restante	Eventos / Hitos Clave
Día 1 (18 May)	12	12	Inicio del Proyecto y Sprint 1. Asignación de roles.
Día 3 (21 May)	9.6	10	Configuración del repositorio y servidor (#106).
Día 5 (23 May)	7.2	7	Diseño de base de datos base e integración (#103, #105).
Día 8 (26 May)	4.8	5	Desarrollo del módulo de registro de usuarios (#101).
Día 11 (29 May)	2.4	2	Finalización de inicio de sesión (#102) y pruebas base.
Día 14 (31 May)	0	0	Cierre exitoso del Sprint 1. Entorno y Auth completos.

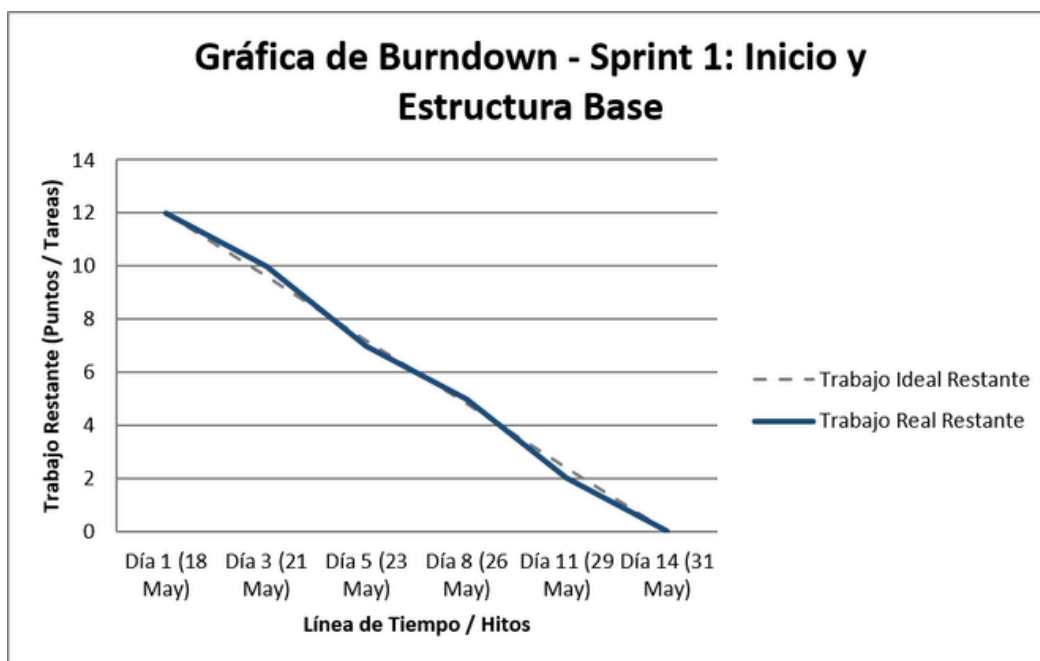

<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



Graficas Burndown

Sprint 3: Catálogo de Productos

Desglose de Historias de Usuario y Tareas				
ID	Historia de Usuario / Tarea	Prioridad	Subtareas / Puntos	Estado Final
#93	HU-08: Visualización del catálogo	Alta	3/3/2026	Terminado (100%)
#94	HU-09: Organización e Inventario	Alta	2/2/2026	Terminado (100%)
#109	Diseñar y crear la BD de productos y stock	Crítica	1/1/2026	Terminado
#110	Programar consultas y visualización dinámica	Crítica	1/1/2026	Terminado
#111	Diseñar interfaz de catálogo y tarjetas	Crítica	1/1/2026	Terminado
#112	Diseñar estructura relacional de categorías	Crítica	1/1/2026	Terminado
#113	Programar gestión de categorías y stock	Crítica	1/1/2026	Terminado
#138	Diseñar y estructurar tablas de BD	Crítica	1/1/2026	Terminado
#139	Desarrollar frontend, backend y validaciones	Crítica	1/1/2026	Terminado
#140	Recursos visuales de Figma y pruebas QA	Crítica	1/1/2026	Terminado



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com




123-456-7890



Gráficas Burndown

Tabla de Datos Burndown			
Semana / Etapa	Trabajo Ideal Restante	Trabajo Real Restante	Observaciones
Inicio (15 Jun)	16	16	Planificación inicial e inicio de BD y UI.
Mitad W1 (19 Jun)	12.8	14	Finalizan tareas #109 y #111.
Fin W1 (22 Jun)	9.6	10	Finaliza #112. En proceso consultas
Mitad W2 (25 Jun)	6.4	5	Finalizan #110 y #113. Avance HU-08
Fin W2 (27 Jun)	3.2	2	Pruebas integradas de tarjetas y stock.
Cierre (28 Jun)	0	0	Cierre de HU-06, #138, #139 y #140 al

Gráfica de Burndown - Sprint 3: Catálogo de Productos

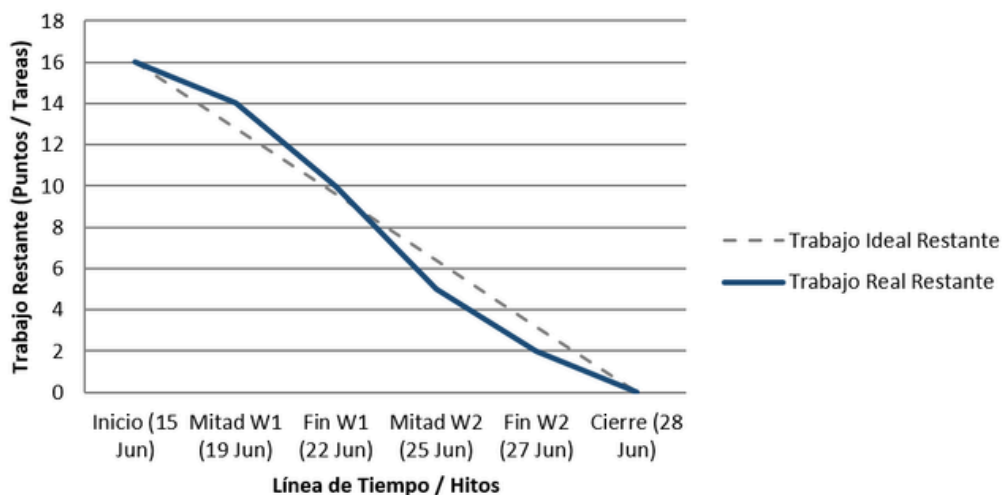

<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



Graficas Burndown

Sprint 4: Administración

Desglose de Historias de Usuario y Tareas				
ID	Historia de Usuario / Tarea	Prioridad	Subtareas / Puntos	Estado Final
#95	HU-10: Gestión de Productos	Alta	2/2/2026	Terminado (100%)
#96	HU-11: Gestión Multimedia	Media	2/2/2026	Terminado (100%)
#114	Programar funciones CRUD desde el panel	Crítica	1/1/2026	Terminado
#115	Diseñar formularios y layouts de administración	Crítica	1/1/2026	Terminado



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com




123-456-7890



Graficas Burndown

Tabla de Datos Burndown

Fecha	Trabajo Ideal Restante	Trabajo Real Restante	Eventos Principales
29 de Junio	8	8	Inicio de Sprint. Definición de layout e interfaces CRUD.
03 de Julio	5.6	6	Finalización de #115 (Layouts). HU-10 alcanza 50%.
06 de Julio	3.8	4	Inicio de desarrollo del módulo de multimedia (HU-11).
10 de Julio	1.8	2	Finalización de funciones CRUD backend (#114).
12 de Julio	0	0	Cierre de HU-10 y HU-11 al 100%.

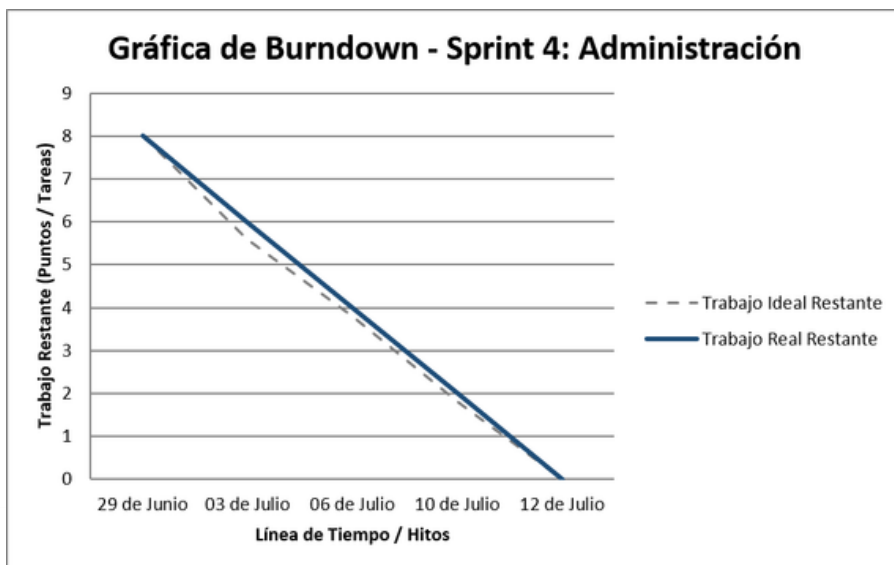

<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890



Graficas Burndown

Sprint 5: Búsqueda y Compra

Desglose de Historias de Usuario y Tareas				
ID	Historia de Usuario / Tarea	Prioridad	Subtareas / Puntos	Estado Final
#97	HU-12: Búsqueda de Productos	Alta	1 / 2 (50%)	En Proceso
#98	HU-13: Filtros de Productos	Alta	1 / 2 (50%)	En Proceso
#99	HU-14: Carrito de Compras	Alta	2 / 3 (66%)	En Proceso
#119	Programar motor interno de búsqueda por nombre/descripción	Alta	0 / 1	Reserva (Backlog)
#120	Diseñar barra de búsqueda e integración en catálogo	Alta	1/1/2026	Terminado (16 Jul)
#121	Diseñar consultas indexadas para filtrar por categoría/precio	Alta	1/1/2026	Terminado (17 Jul)
#122	Programar filtros reactivos en frontend	Crítica	0 / 1	Reserva (Backlog)
#123	Diseñar y crear estructura relacional de carritos activos	Alta	1/1/2026	Terminado (17 Jul)
#124	Programar funciones lógicas para agregar/editar items	Alta	0 / 1	Reserva (Backlog)
#125	Diseñar interfaz detallada del carrito de compras	Alta	1/1/2026	Terminado (23 Jul)



<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com




123-456-7890



Graficas Burndown

Tabla de Datos Burndown			
Fecha / Día	Trabajo Ideal Restante	Trabajo Real Restante	Estado / Actividades
13 de Julio	14	14	Arranque del Sprint 5. Asignación de tareas.
16 de Julio	10.8	12	Completada la barra de búsqueda (#120).
17 de Julio	9.7	10	Completadas consultas de filtros (#121) y estructura de
20 de Julio	6.5	8	HU-12 alcanza 50% de avance.
23 de Julio	3.2	6	Completado diseño de interfaz de carrito (#125). HU-13 al 50%.
26 de Julio	0	4	HU-14 al 66%. Pendiente integración frontend (#122 y

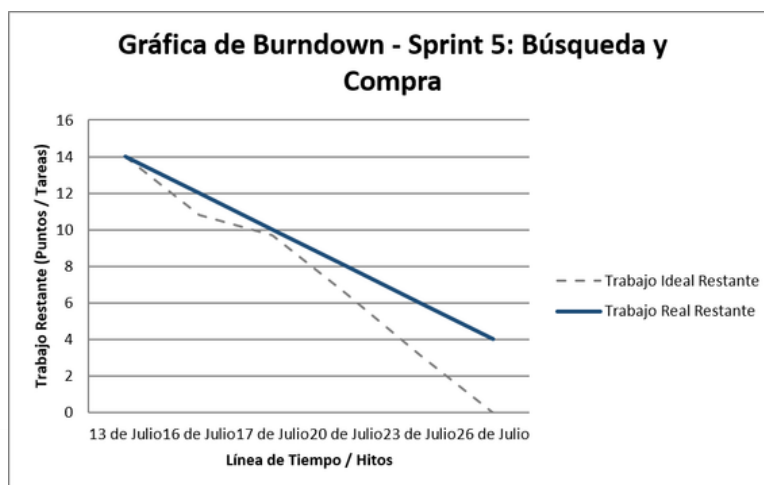

<https://github.com/GuadalupeSolisRuiz/Tienda-de-juguetes>



novasoft@gmail.com



123-456-7890
